D	-5 -5 -5 -5	Anforder Product User Sto	dokumentation	T			Fre 20.07.18 Fre 20.07.18 Fre 20.07.18 Die 24.07.18 Don 26.07.18	Don 06.12.18 Don 02.08.18 Mon 23.07.18 Mit 25.07.18 Fre 27.07.18
	-5 -5 -5	Konzepto Anforder Product User Sto	dokumentation rungskatalog Backlog	T		2 Tage	Fre 20.07.18 Die 24.07.18	Mon 23.07.18 Mit 25.07.18
	-5 -5	Anforder Product User Sto	rungskatalog Backlog	T		2 Tage	Die 24.07.18	Mit 25.07.18
	-5 -5	Product User Sto	Backlog	T				
	-5	User Sto	_	-		2 Tage	Don 26.07.18	Fre 27.07.18
			ries entwickeln und	T I I. I				
	-5	Cariat Da		l askcars ableiten		2 Tage	Mon 30.07.18	Die 31.07.18
		Spriit Ba	acklogs ableiten			2 Tage	Mit 01.08.18	Don 02.08.18
	-5	Analyse	und Entwurf			0 Tage	Don 02.08.18	Don 02.08.18
	*	Prototyp 1	(Sensorvorführung)			90 Tage	Fre 03.08.18	Don 06.12.18
	-3	[Sensoril	k] BLE-RFID: Evaluier	ren		2 Tage	Fre 03.08.18	Mon 06.08.18
	-3	[Sensoril	k] BLE-RFID: Analysie	eren		2 Tage	Die 07.08.18	Mit 08.08.18
	- 5		_	swerten v. Analyse	ewerkzeugen	3 Tage	Fre 03.08.18	Die 07.08.18
		Task		•				^
								•
Sim	ple Project Plan		•	-				*
lit 1	L.07.18				liup			
				•	-	I M	anuai Progress	
				•				
		- →	[Sensorii [Sensorii [Sensorii]] [Sensorii] [Sensorii] [Sensorii] [Core] D und Austria Task Split Milestone Simple Project Plan	[Sensorik] BLE-RFID: Evaluier [Sensorik] BLE-RFID: Analysic [Core] Datenauswertung: Au und Auswahl treffen Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task	[Sensorik] BLE-RFID: Evaluieren [Sensorik] BLE-RFID: Analysieren [Core] Datenauswertung: Auswerten v. Analyse und Auswahl treffen Task Split Manual Task Milestone Summary Project Summary Inactive Task Start-only Start-only	[Sensorik] BLE-RFID: Evaluieren [Sensorik] BLE-RFID: Analysieren [Core] Datenauswertung: Auswerten v. Analysewerkzeugen und Auswahl treffen Task Split Manual Task Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Start-only Inactive Milestone Finish-only	[Sensorik] BLE-RFID: Evaluieren 2 Tage [Sensorik] BLE-RFID: Analysieren 2 Tage [Core] Datenauswertung: Auswerten v. Analysewerkzeugen und Auswahl treffen Task Split Manual Task Split Milestone Duration-only Summary Project Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Start-only Inactive Milestone Finish-only	[Sensorik] BLE-RFID: Evaluieren 2 Tage Fre 03.08.18 [Sensorik] BLE-RFID: Analysieren 2 Tage Die 07.08.18 [Core] Datenauswertung: Auswerten v. Analysewerkzeugen und Auswahl treffen 3 Tage Fre 03.08.18 Task Inactive Summary External Tasks External Milestone Duration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Inactive Task Start-only Inactive Task Inactive Milestone Finish-only

lr.	A	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
13		-5	[Core] Datenauswertung: Werkzeug-API/Dokumentation lesen	3 Tage	Mit 08.08.18	Fre 10.08.18
14		-5	[Core] Dateiformate: relev. Standards evaluieren	3 Tage	Fre 03.08.18	Die 07.08.18
15		-5	[Core] Dateiformate: Nutzungsbedingungen u. Voraussetzungen klären	3 Tage	Mit 08.08.18	Fre 10.08.18
16		-5	[Core] Übertragungsprotokolle: Industriestandards auswerten	3 Tage	Fre 03.08.18	Die 07.08.18
17		-5	[Core] Übertragungsprotokolle: Dokumentation u. Hinweise lesen	3 Tage	Mit 08.08.18	Fre 10.08.18
18		-5	[UI] Display: meist genutzte Technologien analysieren	3 Tage	Fre 03.08.18	Die 07.08.18
19		-5	[UI] Display: verfügbare Schnittstellen auswerten	3 Tage	Mit 08.08.18	Fre 10.08.18
20		=5	[UI] Display: Lizenzgebühren und -modelle für Übertragungslösungen prüfen	3 Tage	Mit 08.08.18	Fre 10.08.18
21		-5	[Sensorik] BLE-RFID: Implementierung	30 Tage	Die 07.08.18	Mon 17.09.18
22		-5	[Sensorik] BLE-RFID: Funktionstests	2 Tage	Die 18.09.18	Mit 19.09.18
23		-5	[Sensorik] BLE-RFID: Modultests	2 Tage	Die 18.09.18	Mit 19.09.18
24		-5	[Meilenstein] Prototyp 1	0 Tage	Mit 19.09.18	Mit 19.09.18

Task **Inactive Summary** External Tasks External Milestone Split Manual Task Deadline Milestone Duration-only Project: Simple Project Plan Summary Manual Summary Rollup Progress Date: Mit 11.07.18 **Project Summary** Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only Inactive Milestone Finish-only]

lr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname				Dauer	Anfang	Ende
25	-5	Prototyp 2	[Mobile App, Daten	persistenz, Lokais	sierung]	6 Tage	Don 20.09.18	Don 27.09.18
26			rtphone-App: Fragm nalysieren und Ausw elt wird	•		3 Tage	Don 20.09.18	Mon 24.09.18
27	-5	[UI] Sma auswähl	rtphone-App: Frame en	eworks evaluieren	und	3 Tage	Die 25.09.18	Don 27.09.18
28	-5	[UI] Sma	rtphone-App: Zielgru	uppenanalyse für	UI und UX	3 Tage	Don 20.09.18	Mon 24.09.18
29	-5		rtphone-App: Studie e zum UI Design	e und Umfrage für	die gewählte	3 Tage	Die 25.09.18	Don 27.09.18
30	-5		atenbank: Datenban	ktechnloggien eva	aluieren	3 Tage	Don 20.09.18	Mon 24.09.18
31	-5	[Core] Se	erver: Kosten evaluie	eren/einschätzen		3 Tage	Don 20.09.18	Mon 24.09.18
32	-5	[Core] D	atenauswertung: Im	plementierung		4 Tage	Don 20.09.18	Die 25.09.18
33	-5	[Core] D	atenauswertung: Im	plementierung		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
34	-5	[Core] D	atenauswertung: Fui	nktionstest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
35	-5	[Core] D	atenauswertung: Mo	odultest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
36	-9	[Core] D	ateiformate: Implem	nentierung		4 Tage	Don 20.09.18	Die 25.09.18
	<u> </u>	Task		Inactive Summary] E	external Tasks	
		Split		Manual Task		E	xternal Milestone	\Diamond
Project [.]	Simple Project Plan	Milestone	♦	Duration-only			Deadline	•
•	t 11.07.18	Summary		Manual Summary Ro	ollup	F	Progress	
		Project Summary		Manual Summary			Manual Progress	
		Inactive Task		Start-only	Е			
		Inactive Milestone		Finish-only]			


Nr.	organgsmodus/	Vorgangsname				Dauer	Anfang	Ende
37	-5	[Core] D	ateiformate: Funkt	ionstest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
38	5	[Core] D	ateiformate: Modu	lltest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
39	5	[Core] Ü	bertragungsprotok	olle: Implementierung		4 Tage	Don 20.09.18	Die 25.09.18
40	5	[Core] Ü	bertragungsprotok	olle: Funktionstest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
41	-5	[Core] Ü	bertragungsprotok	olle: Modultest		2 Tage	Mit 26.09.18	Don 27.09.18
42	-5	[Meilens	stein] Prototyp 2			0 Tage	Don 27.09.18	Don 27.09.18
43	9	Sammelvo	rgang 3			10 Tage	Fre 28.09.18	Don 11.10.18
44	-5	[Sensori	k] WLAN: Evaluiere	n		2 Tage	Fre 28.09.18	Mon 01.10.18
45	5	[Sensori	k] WLAN: Analysier	en		2 Tage	Die 02.10.18	Mit 03.10.18
46	5	[Sensori	k] WLAN: Impleme	ntierung		2 Tage	Don 04.10.18	Fre 05.10.18
47	5	[Sensori	k] WLAN: Funktions	stests		2 Tage	Mon 08.10.18	Die 09.10.18
48	5	[Sensori	k] WLAN: Modultes	sts		2 Tage	Mon 08.10.18	Die 09.10.18
		Task		Inactive Summary		Ex	cternal Tasks	
		Split		Manual Task		Ex	cternal Milestone	\Diamond
Project: Simp	le Project Plan	Milestone	♦	Duration-only		De	eadline	•
Date: Mit 11.0	•	Summary		Manual Summary Rollup	_		rogress	
		Project Summary		Manual Summary		М	anual Progress	
		Inactive Task		Start-only				


Finish-only

Inactive Milestone

_

Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname				Dauer	Anfang	Ende
49	-5	[Sensorik	k] Laser: Evaluieren			2 Tage	Fre 28.09.18	Mon 01.10.18
50	=5	[Sensorik	k] Laser: Analysieren			2 Tage	Die 02.10.18	Mit 03.10.18
51	=5	[Sensorik	k] Laser: Implementie	erung		2 Tage	Don 04.10.18	Fre 05.10.18
52	-5	[Sensorik	k] Laser: Funktionstes	sts		2 Tage	Mon 08.10.18	Die 09.10.18
53	=5	[Sensorik	k] Laser: Modultests			2 Tage	Mon 08.10.18	Die 09.10.18
54	-5	[Sensorik	[Integrationstest			2 Tage	Mit 10.10.18	Don 11.10.18
55	-5	[Core] Da	atesicherheit: Aktuel vählen	le Standards/Tech	nik evaluieren	3 Tage	Fre 28.09.18	Die 02.10.18
56	-5		atesicherheit: gewäh	lte Standards imp	lementieren	2 Tage	Mit 03.10.18	Don 04.10.18
57	-5	[Core] Da	atesicherheit: Funktio	onstest		1 Tag	Fre 05.10.18	Fre 05.10.18
58	-5	[Core] In	tegrationstest			1 Tag	Mon 08.10.18	Mon 08.10.18
59	-5	[Datenha	altung] Server: Hardw	vare einrichten		1 Tag	Fre 28.09.18	Fre 28.09.18
60	-5	[Datenha und einri	altung] Server: Syste ichten	me, Frameworks	nstallieren	1 Tag	Mon 01.10.18	Mon 01.10.18
61	-5	[UI] Smai	rtphone-App: Test			1 Tag	Fre 28.09.18	Fre 28.09.18
	<u> </u>	Task		Inactive Summary			External Tasks	
		Split		Manual Task			External Milestone	\Diamond
Project:	Simple Project Plan	Milestone	♦	Duration-only			Deadline	•
-	it 11.07.18	Summary		Manual Summary Ro	lup		Progress	
		Project Summary		Manual Summary			Manual Progress	
		Inactive Task		Start-only	Е			
		Inactive Milestone		Finish-only]			

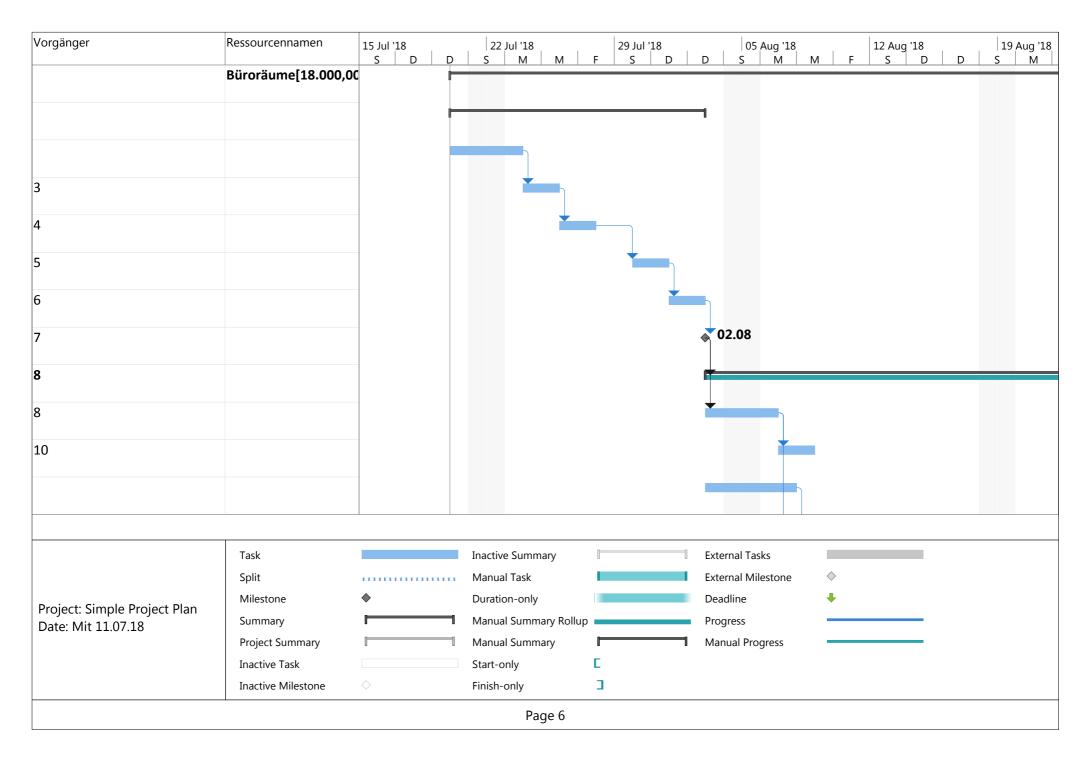

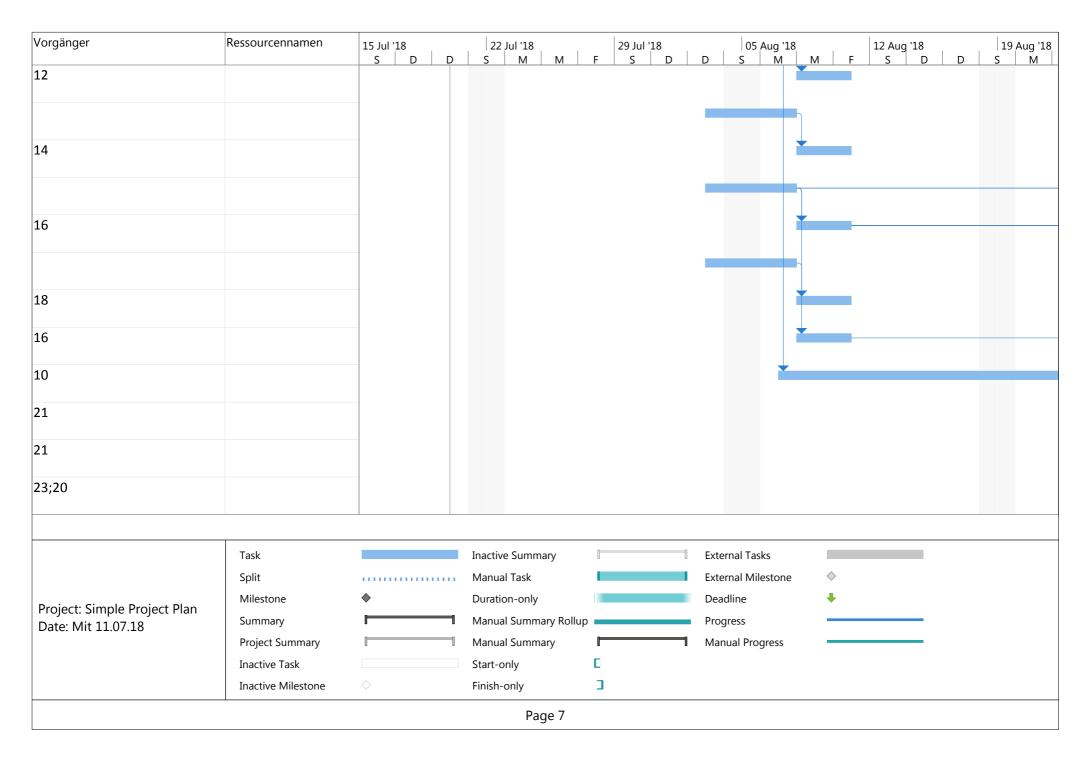

Vorgänger	Ressourcennamen	15 Jul ' S	'18		22	Jul '18			29 Jul S	'18	1 _	05	Aug '18	3	1 _	12 Aug	g '18	l _	19	Aug '18
24		<u> </u>	D	D	S	М	М	F	<u> </u> S	D	D	S	M	М	F	<u> </u>	D	D	S	M
24																				
26																				
28																				
20																				
16																				
4.6																				
16																				
17																				
32																				
32																				
32																				
17																				
	Task				Inactiv	e Summ	ary				Ext	ernal Ta	sks							
	Split				Manua		,						ilestone	<	>					
Duningty Cinnals Duningt Dlaw	Milestone	♦			Durati	on-only					Dea	adline		4	}					
Project: Simple Project Plan Date: Mit 11.07.18	Summary				Manua	al Summa	ary Roll	up 🚃			Pro	gress		-						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Project Summary				Manua	al Summa	ary				1 Ma	nual Pro	ogress	-						
	Inactive Task				Start-d			Е												
	Inactive Milestone	\Diamond			Finish-	only]												
						Pad	ge 8													

Vorgänger	Ressourcennamen	15 Jul '18 S D D	22 Jul '18 S M M	29 Jul '18 F S D	05 Aug '18 D S M	12 Aug '18 M F S D	19 Aug	g '18 M
36			, IVI	. , 5 , 5 ,	2 3	, , , , , ,		
36								
17								
39								
39								
41								
42								
44								
45								
46								
46								
	Task		Inactive Summary		External Tasks			
	Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
Project: Simple Project Plan	Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
Date: Mit 11.07.18	Summary		Manual Summary Rollu	р	Progress			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
	Inactive Task		Start-only	Е				
	Inactive Milestone		Finish-only	3				
	l		Page 9					

Vorgänger	Ressourcennamen	15 Jul	'18		22	2 Jul '18			29 Jul	'18		05	Aug '18	}		12 Au	g '18		19	Aug '1
		15 Jul S	D	D	S	M	М	F	29 Jul S	D	D	S	Aug '18 M	M	F	12 Au		D	S	Aug '1 M
49																				
50																				
51																				
J1																				
51																				
~ -																				
53																				
42																				
55																				
- .																				
56																				
57																				
57																				
42																				
59																				
42																				
	Task				Inactiv	ve Summ	narv				Ext	ernal Ta	sks							
	Split					al Task)						ilestone	<	>					
	Milestone	•				ion-only						adline	nestone		-					
Project: Simple Project Plan		·												_	•					
Date: Mit 11.07.18	Summary					al Summ		up =				ogress								
	Project Summary	U		U		al Summ	агу	-			ı Ma	nual Pro	ogress							
	Inactive Task				Start-															
	Inactive Milestone	\Diamond			Finish	-only		J												
						Pac	ge 10													

